


ASA Dyonne et Plumion
Restauration du Mesmont
Tranche 2012



Constat 2011 : Zone de surlargeur avec homogénéité du milieu

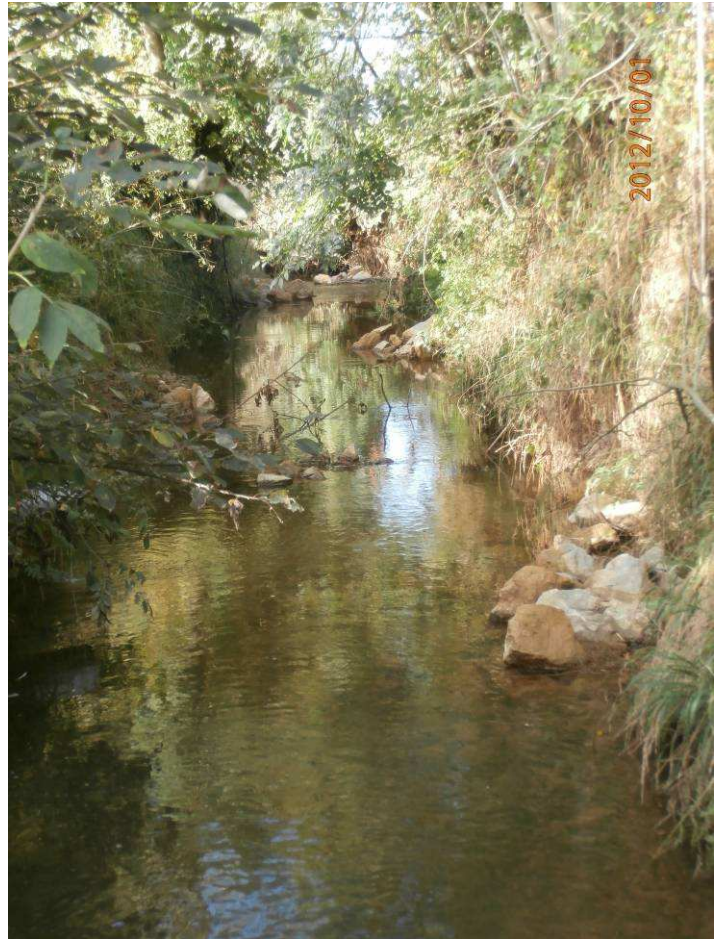

Réalisation 2012 : apport de graviers et de blocs en alternant rive droite/ gauche/ milieu du lit afin de diversifier le milieu



Constat 2011 : Zone de radier existante à conserver et à rallonger.



Réalisation 2012 : Maintien du radier et prolongement de celui-ci sur 5m

ASA Dyonne et Plumion
Restauration du Mesmont
Tranche 2012



Constat 2011 : Zone aval du pont de la RD 21. Observation d'une chute au niveau du radier du pont.



Réalisation 2012 : confection d'un radier pour compenser la chute du pont et faciliter le franchissement de l'obstacle



Constat 2011 : Zone de chenal décapée



Réalisation 2012 : confection d'un radier ou seuil de fonds (suivant les cas) afin de limiter l'engraissement du lit et faciliter la recharge sédimentaire du cours d'eau.
